

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:		%		%	
TERMINO PREVISTO:		24/07/2024		PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA-013/2023		ADITIVO DE SUPRÊSOS:		%		%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - D. RETORIBA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 037/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$		2.213.304,51	
DATA DE EMÍSSÃO:		04/03/2024		CONTRATO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:		Nº 025/2023		VALOR DO CONTRATO		R\$		2.213.304,51	
PERÍODO:		02/02/2024		ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		VALOR DO PERÍODO:		R\$		% ACUMULADO		56,66%			
SINAP Nº 09/2023 - NÃO DESONERADA, SICRO 07/2023 - NÃO DESONERADA, OFSE 09/2023, COMPESS 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		04/03/2024		EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		VALOR DO PERÍODO:		R\$		% DESTES B.M.		5,47%			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO					
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	SINAP	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	-	6,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 8.993,68	R\$ 560,38	R\$ 1.681,14	R\$ 7.302,54
1.2	Composições Próprias	CP-0002-PMSLM	ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ALIAMENTO/ DEPÓSITO DE MATERIAS (BAIRRO MURIBARA)	MES	12,00	1,00	9,00	8,00%	25,00%	75,00%	75,00%	R\$ 6.724,56	R\$ 560,38	R\$ 1.681,14	R\$ 5.043,42
7			RUA DIANIRA DA FONTE												
2.1			DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/RECOMPOSIÇÕES												
2.1.1	Composições Próprias	CP-500021-PMSLM	DEMOLUÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO OU PRI- MOLDADO	M	53,00	-	53,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 749,95	R\$ -	R\$ 749,95	R\$ -
2.1.2	Composições Próprias	CP-14.01.16-PMSLM	DEMOLUÇÃO DE PASSELO EM CONCRETO SIMPLES	M2	17,00	-	17,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 526,32	R\$ -	R\$ 526,32	R\$ -
2.1.3	Composições Próprias	CP-19.07.580-PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	17,00	-	17,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.982,03	R\$ -	R\$ 1.982,03	R\$ -
2.2			MOVIMENTO DE TERRA												
2.2.1	SINAP	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	998,83	-	998,72	0,00%	99,00%	0,00%	0,00%	R\$ 3.216,23	R\$ -	R\$ 3.216,23	R\$ 0,35
2.2.2	Composições Próprias	CP-19322-PMSLM	CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROSCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	249,70	-	249,68	0,00%	99,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.720,43	R\$ -	R\$ 1.720,43	R\$ 0,13
2.2.3	SINAP	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KV (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.498,24	-	1.498,08	0,00%	99,00%	0,00%	0,00%	R\$ 4.434,79	R\$ -	R\$ 4.434,31	R\$ 0,47
2.3			PAVIMENTAÇÃO												
2.3.1	SINAP	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	106,25	-	106,25	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 21.485,87	R\$ -	R\$ 21.485,87	R\$ -
2.3.2	SINAP	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	885,53	-	885,46	0,00%	99,00%	0,00%	0,00%	R\$ 92.086,26	R\$ -	R\$ 92.078,98	R\$ 7,27
2.3.3	SINAP	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COM PRIMO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	393,29	-	393,25	0,00%	99,00%	0,00%	0,00%	R\$ 28.120,23	R\$ -	R\$ 28.117,37	R\$ 2,86
2.3.4	Composições Próprias	CP-502622-PMSLM	MEIO-FIO GRANITICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	62,25	-	62,25	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.638,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.638,51
2.3.5	SINAP	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	393,29	-	393,25	0,00%	99,00%	0,00%	0,00%	R\$ 20.285,89	R\$ -	R\$ 20.283,83	R\$ 2,06
2.3.6	SINAP	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KV (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.243,00	-	3.187,50	0,00%	98,00%	1,00%	1,00%	R\$ 9.599,28	R\$ -	R\$ 9.435,00	R\$ 164,28
2.4			URBANIZAÇÃO												
2.4.1	SINAP	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	17,69	-	17,69	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 1.758,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.758,03
2.4.2	SINAP	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	5,89	-	5,89	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 4.149,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.149,21
2.4.3	Composições Próprias	CP-C0074-PMSLM	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-20 cm	M2	117,98	-	117,98	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 16.900,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.900,63
2.4.4	SINAP	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	78,65	-	78,65	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 654,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 654,36
2.4.5	SINAP	87794	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	78,65	-	78,65	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 4.115,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.115,75
2.4.6	SINAP	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	70,78	-	70,78	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 6.582,54	R\$ -	R\$ 6.582,54	R\$ -
2.4.7	SINAP	94990	EXECUÇÃO DE PASSELO (CAIÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARNIADO. AF_08/2022	M3	29,49	-	29,49	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 25.085,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.085,37
2.4.8	SINAP	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	19,92	-	19,92	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 3.206,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.206,92

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

José Severino da Silva
Tecnólogo em Contabilidade
Civil-Edificações Responsável ou Responsável Técnico
Registro: 18113503-3

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023	MUNICÍPIO/UF:		SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO	0,00%			
TERMINO PREVISTO:		24/07/2024	PROPONENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA-013/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO	0,00%			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS	GESTOR / AÇÃO:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - D. BETOIRIA DE OBRAS	CONTRATO:		Nº 037/2023	VALOR DO CONTRATO ADITADO		% TOTAL	0,00%			
DATA DE EMÍSSÃO:		04/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE <td></td> <th colspan="2">PROCESSO:</th> <td>Nº 025/2023</td> <td colspan="4"></td>			PROCESSO:		Nº 025/2023							
PERÍODO:		02/02/2024 - 04/03/2024	VALOR DO CONTRATO:		R\$ 2.213.304,51	% ACUMULADO:		56,66%							
			VALOR DO PERÍODO:		R\$ 120.963,87	% DESTA BM:		5,47%							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO				FÍSICO				FINANCEIRO			
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO
3.4.4	SINAP	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	69,75	-	69,75	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	580,32	R\$	580,32	
3.4.5	SINAP	87794	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	69,75	-	69,75	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	3.650,01	R\$	3.650,01	
3.4.6	SINAP	94319	ATEIRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL-ARENOSO. AF_08/2023	M3	62,77	-	62,78	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	5.838,54	R\$	5.838,54	
3.4.7	SINAP	94990	EXCUTÃO DE PASSO (CAICADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO. FLUTO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARRANDO. AF_08/2022	M3	26,15	-	26,15	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	22.244,23	R\$	22.244,23	
3.4.8	SINAP	104658	PISO PODOIÁTIL DE ALERTIA OU DIRECIONAL DE CONCRETO, ASSINIADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	23,04	-	23,04	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	3.709,20	R\$	3.709,20	
3.5			SINALIZAÇÃO								R\$	9.029,09	R\$	9.029,09	
3.5.1	Composições Próprias	CP-73916/002-PMSLM	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25CM	UN	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	222,86	R\$	222,86	
3.5.2	SINAP	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA BASE DE CAL (CAIÇÃO) AF_05/2021	M	342,80	-	342,80	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	658,17	R\$	658,17	
3.5.3	Composições Próprias	CP-40931-PMSLM	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	M2	19,80	-	19,80	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	6.587,85	R\$	6.587,85	
3.5.4	SINAP	97092	ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q.196. AF_09/2021	KG	61,57	-	61,57	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	988,19	R\$	988,19	
3.5.5	SINAP	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E. - 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	19,80	-	19,80	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	572,02	R\$	572,02	
3.6			DRENAGEM								R\$	31.871,28	R\$	31.871,28	
3.6.1	SINAP	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	22,00	-	16,00	0,00%	72,00%	27,00%	R\$	5.800,08	R\$	4.218,24	
3.6.2	Composições Próprias	COMP-19.04.040-PMSLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	340,00	-	261,60	0,00%	76,00%	23,00%	R\$	26.071,20	R\$	20.059,48	
4			RUA EURICO DA FONTE								R\$	286.391,42	R\$	286.391,42	
4.1			DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/RECOMPOSIÇÕES								R\$	10.226,11	R\$	10.226,11	
4.1.1	Composições Próprias	CP-500021-PMSLM	DEMOLUÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	336,68	-	336,60	0,00%	99,00%	0,00%	R\$	4.764,02	R\$	4.764,02	
4.1.2	Composições Próprias	CP-14.01.16-PMSLM	DEMOLUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	M2	135,00	-	135,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$	4.179,60	R\$	4.179,60	
4.1.3	Composições Próprias	CP-19.07.580-PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	11,00	-	11,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$	1.282,49	R\$	1.282,49	
4.2			MOVIMENTO DE TERRA								R\$	9.712,75	R\$	9.712,75	
4.2.1	SINAP	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.035,20	-	1.034,83	0,00%	99,00%	0,00%	R\$	3.333,34	R\$	3.333,15	
4.2.2	Composições Próprias	CP-19322-PMSLM	CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROSCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³. MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	258,80	-	258,71	0,00%	99,00%	0,00%	R\$	1.783,13	R\$	1.782,51	
4.2.3	SINAP	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KV (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.552,80	-	1.552,25	0,00%	99,00%	0,00%	R\$	4.596,28	R\$	4.596,66	
4.3			PAVIMENTAÇÃO								R\$	174.142,83	R\$	173.353,03	
4.3.1	SINAP	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	112,09	-	112,09	0,00%	100,00%	0,00%	R\$	22.666,83	R\$	22.666,83	
4.3.2	SINAP	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELOS EPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	934,20	-	934,07	0,00%	99,00%	0,00%	R\$	97.147,45	R\$	97.133,93	
4.3.3	SINAP	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	345,36	-	345,35	0,00%	99,00%	0,00%	R\$	24.693,24	R\$	24.692,57	
4.3.4	Composições Próprias	CP-502622-PMSLM	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	31,96	-	18,70	0,00%	58,00%	41,00%	R\$	1.868,06	R\$	1.093,01	

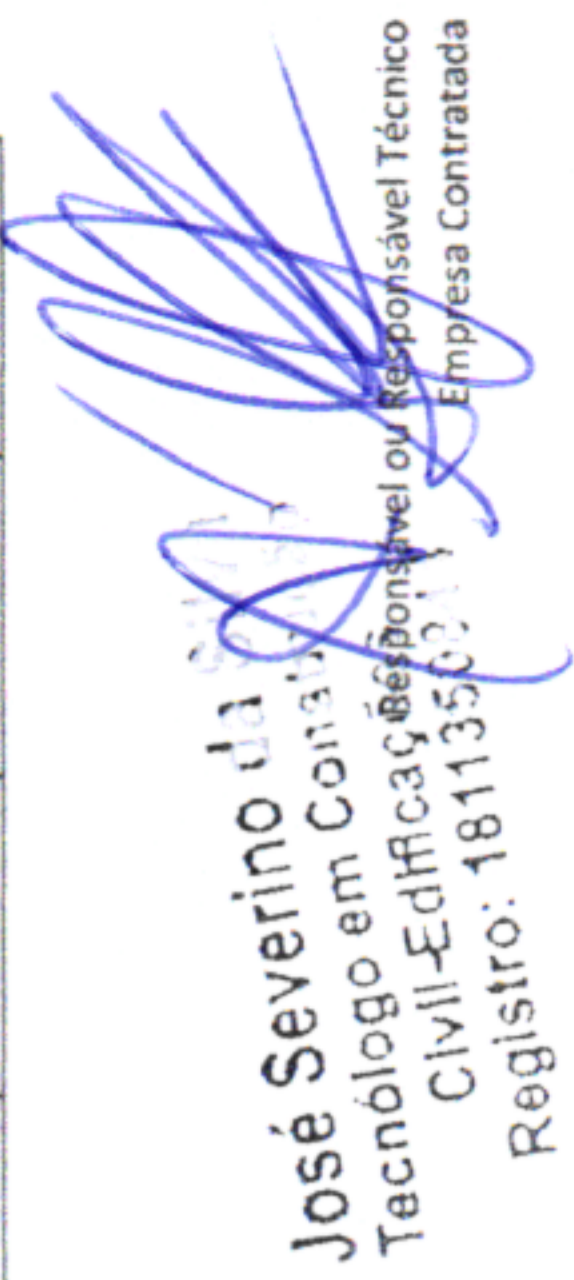
BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

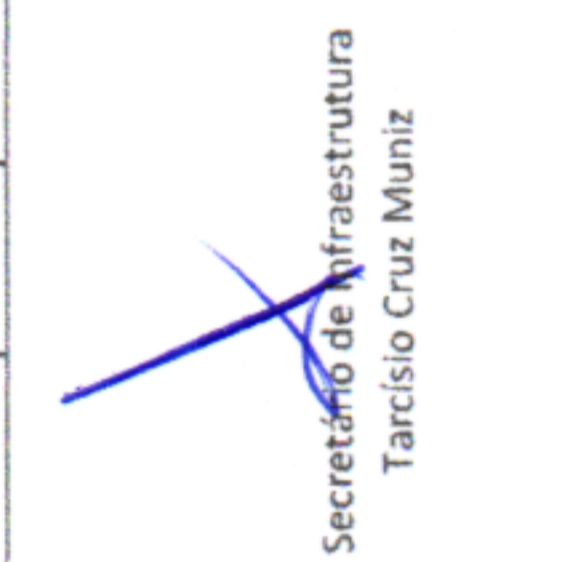
INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO		0,00%	
TÉRMINO PREVISTO:		24/07/2024		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 013/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO		0,00%	
PRazo DE EXECUÇÃO:		210 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 032/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		% TOTAL		0,00%	
DATA DE EMISSÃO:		04/03/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:		Nº 025/2023		R\$ 2.213.304,51					
PERÍODO:		02/02/2024 - 04/03/2024		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 2.213.304,51		% ACUMULADO		56,66%					
SINAPI 09/2023 - NÃO DESONERADA, SICD 07/2023 - NÃO DESONERADA, ORSE 08/2023, COMPSA 05/2023 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				MED DO NO PERÍODO:		R\$ 120.963,87		% DESTA BM		5,47%					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO			SALDO		
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
4.3.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TIELO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2016	M	345,36	0,01	345,35	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 17.813,66	R\$ 17.813,15	R\$	0,51	
4.3.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.362,70	-	3.362,70	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 9.953,59	R\$ 9.953,59	R\$	-	
4.4			URBANIZAÇÃO												
4.4.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	15,53	-	15,53	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.543,37	R\$	R\$	1.543,37	
4.4.2	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	5,17	-	5,17	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 3.642,00	R\$	R\$	3.642,00	
4.4.3	Composições Próprias	CP-C0074 PMSLM	ALVENARIA DE TIELO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-20 cm	M2	103,60	-	103,60	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 14.840,70	R\$	R\$	14.840,70	
4.4.4	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLUHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	69,06	-	69,06	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 574,57	R\$	R\$	574,57	
4.4.5	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS CIGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	57,56	-	57,56	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 3.012,11	R\$	R\$	3.012,11	
4.4.6	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL. ARENOSO. AF_08/2023	M3	77,69	-	77,69	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 7.225,17	R\$ 7.225,17	R\$	-	
4.4.7	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	25,89	-	25,89	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 22.023,06	R\$	R\$	22.023,06	
4.4.8	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	13,28	-	13,28	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 2.137,94	R\$	R\$	2.137,94	
4.5			SINALIZAÇÃO												
4.5.1	Composições Próprias	CP-73916/002-PMSLM	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 222,86	R\$	R\$	222,86	
4.5.2	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAUAÇÃO). AF_05/2021	M	345,36	-	345,36	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 663,09	R\$	R\$	663,09	
4.5.3	Composições Próprias	CP-40931-PMSLM	ONDUÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	M2	19,80	-	19,80	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 6.587,85	R\$	R\$	6.587,85	
4.5.4	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	61,57	-	61,57	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 988,19	R\$	R\$	988,19	
4.5.5	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	19,80	-	19,80	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 572,02	R\$	R\$	572,02	
4.6			DRENAGEM												
4.6.1	Composições Próprias	COMP-19.04.040-PMSLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	300,00	-	300,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 23.004,00	R\$	R\$	23.004,00	
4.6.2	SINAPI	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	20,00	-	20,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 5.272,80	R\$	R\$	5.272,80	
5			RUA LEOPOLDINA BANDEIRA												
5.1			DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/RECOMPOSIÇÕES												
5.1.1	Composições Próprias	CP-S00021-PMSLM	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	43,00	-	43,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 608,45	R\$	R\$	608,45	
5.1.2	Composições Próprias	CP-19.07.580-PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	6,00	-	6,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 699,54	R\$	R\$	699,54	
5.2			MOVIMENTO DE TERRA												
5.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.976,24	-	1.976,24	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 6.363,49	R\$	R\$	6.363,49	
5.2.2	Composições Próprias	CP-19.322-PMSLM	CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROSCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³. MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	494,06	-	494,06	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 3.404,07	R\$	R\$	3.404,07	
5.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.964,36	-	2.964,36	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 8.774,50	R\$	R\$	8.774,50	
5.3			PAVIMENTAÇÃO												
5.3.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	209,42	-	209,42	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 42.348,91	R\$	R\$	42.348,91	



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023	MUNICÍPIO/UF:		SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	ADITIVO DE VALOR:			% ADITADO		0,00%	
TERMINO PREVISTO:		24/07/2024	PROPOSTANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 013/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:			% SUPRIMIDO		0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS	GESTOR / AÇÃO:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:		Nº 037/2023	VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 2.213.304,51	% TOTAL		0,00%	
DATA DE EMÍSSÃO:		04/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE <td></td> <th colspan="2">PROCESSO:</th> <td>Nº 025/2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			PROCESSO:		Nº 025/2023							
PERÍODO:		02/02/2024 - 04/03/2024	VALOR DO CONTRATO:		R\$ 2.213.304,51	%		ACUMULADO	56,66%	FINANCEIRO					
SINAPI 09/2023 - NÃO DESONERADA, SICRO 07/2023 - NÃO DESONERADA, ORSE 09/2023, COMPESA 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS <td></td> <th colspan="2">VALOR DO PERÍODO:</th> <td>R\$ 120.963,87</td> <th colspan="2">%</th> <td>DESTE BM</td> <td>5,47%</td> <th colspan="2">FÍSICO</th> <td></td> <td></td> <td></td>			VALOR DO PERÍODO:		R\$ 120.963,87	%		DESTE BM	5,47%	FÍSICO					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FINANCEIRO			FÍSICO			FINANCEIRO		
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO
5.3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 103,99	1.745,22	-	1.745,22	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 181.485,42	R\$ -	R\$ 181.485,42
5.3.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COM/PRIVENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 71,50	541,74	-	541,74	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 38.734,41	R\$ -	R\$ 38.734,41
5.3.4	Composições Próprias	CP-502622-PMSLM	MET. FIO GRAMÁTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	R\$ 58,45	96,25	-	96,25	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.625,81	R\$ -	R\$ 5.625,81
5.3.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 51,58	541,74	-	541,74	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 27.942,94	R\$ -	R\$ 27.942,94
5.3.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DIM: ATÉ 30 KV (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,96	6.282,60	-	6.282,60	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 18.596,49	R\$ -	R\$ 18.596,49
5.4			URBANIZAÇÃO												
5.4.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 99,38	24,37	-	24,37	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 78.133,91	R\$ -	R\$ 78.133,91
5.4.2	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	R\$ 704,45	8,12	-	8,12	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.421,89	R\$ -	R\$ 2.421,89
5.4.3	Composições Próprias	CP-CD074-PMSLM	ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-20 cm	M2	R\$ 143,25	162,52	-	162,52	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 23.280,99	R\$ -	R\$ 23.280,99
5.4.4	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLIER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	R\$ 8,32	108,34	-	108,34	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 901,38	R\$ -	R\$ 901,38
5.4.5	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PISOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	R\$ 52,33	108,34	-	108,34	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.669,43	R\$ -	R\$ 5.669,43
5.4.6	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	M3	R\$ 93,00	97,51	-	97,51	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 9.068,43	R\$ -	R\$ 9.068,43
5.4.7	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 850,64	32,50	-	32,50	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 27.645,80	R\$ -	R\$ 27.645,80
5.4.8	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	R\$ 160,99	21,28	-	21,28	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.425,86	R\$ -	R\$ 3.425,86
5.5			SINALIZAÇÃO												
5.5.1	Composições Próprias	CP-73916/002-PMSLM	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	R\$ 111,43	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 222,86	R\$ -	R\$ 222,86
5.5.2	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇADA). AF_05/2021	M	R\$ 1,92	711,70	-	711,70	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.366,46	R\$ -	R\$ 1.366,46
5.5.3	Composições Próprias	CP-40931-PMSLM	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	M2	R\$ 332,72	48,75	-	48,75	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 16.220,10	R\$ -	R\$ 16.220,10
5.5.4	SINAPI	97092	ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	R\$ 16,05	151,59	-	151,59	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.433,01	R\$ -	R\$ 2.433,01
5.5.5	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	R\$ 28,89	48,75	-	48,75	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.408,38	R\$ -	R\$ 1.408,38
5.6			DRENAGEM												
5.6.1	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,2 M. AF_12/2020	UN	R\$ 1.649,26	1,00	-	1,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.649,26	R\$ -	R\$ 1.649,26
5.6.2	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 314,28	8,00	-	8,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.514,24	R\$ -	R\$ 2.514,24
5.6.3	SINAPI	102750	BOCA PARA BUENOS SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 30°, INCLINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	R\$ 3.080,93	1,00	-	1,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.080,93	R\$ -	R\$ 3.080,93
5.6.4	SICRO NOVO	2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	R\$ 65,54	1,00	-	1,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 65,54	R\$ -	R\$ 65,54
5.6.5	SICRO NOVO	2003391	Descida d'água de aterros tipo raspão - DAR 02 - areia e brita comerciais	m	R\$ 189,01	3,00	-	3,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 567,03	R\$ -	R\$ 567,03
5.6.6	SINAPI	103930	BACIA DE DISSIPACÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DER 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCX = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÓRMAS (7 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	R\$ 917,53	0,49	-	0,49	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 447,13	R\$ -	R\$ 447,13


José Severino da Silva
 Tecnólogo em Contabilidade
 Civil-Edificações Responsável Técnico
 Registro: 18113563

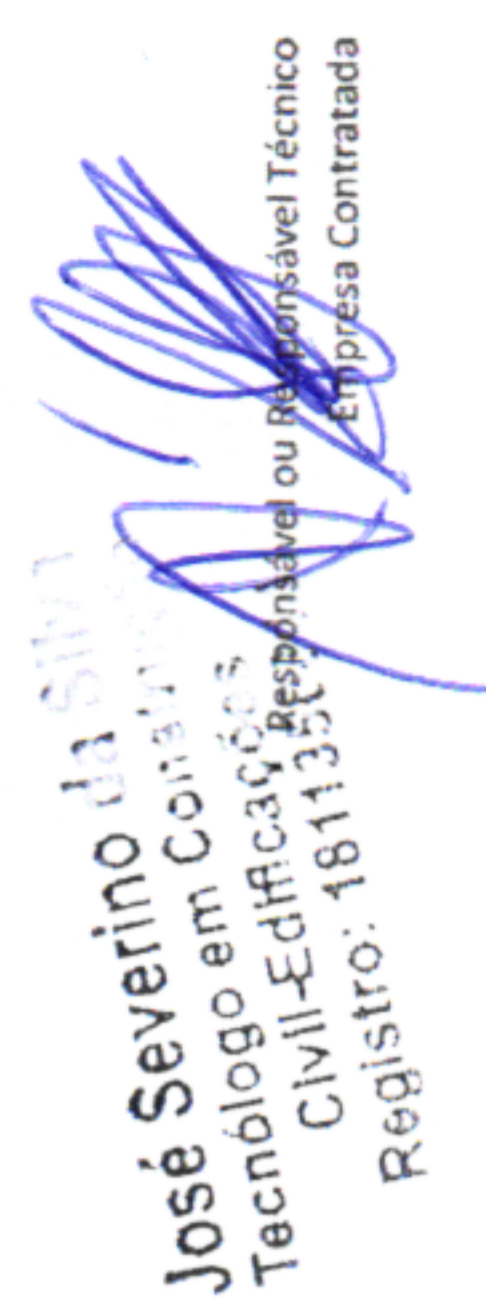

Tarcísio Cruz Muniz
 Secretário de Infraestrutura

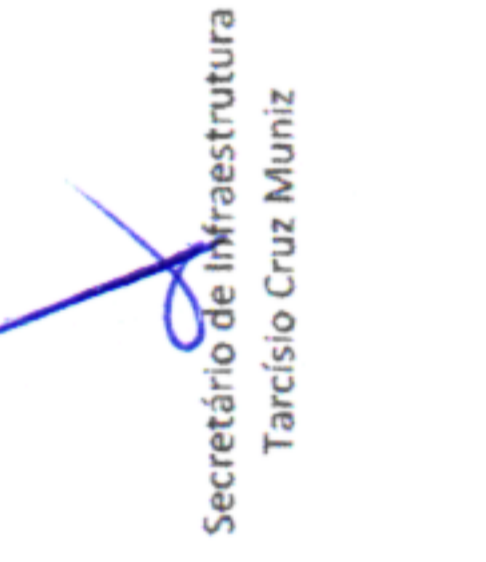
Responsável Técnico Pela Fiscalização
 Djailson Pereira de Oliveira
 CRT-PE: 181613657-3



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO		0,00%			
TERMINO PREVISTO:		24/07/2024	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA <td colspan="2">MODALIDADE:</td> <td colspan="2">CONCORRÊNCIA-013/2023</td> <td colspan="2">ADITIVO DE SUPRESSÃO:</td> <td colspan="2">% SUPRIMIDO</td> <td colspan="2">0,00%</td>		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA-013/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO		0,00%			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - D. RETÓRIA DE OBRAS <td colspan="2">CONTRATO:</td> <td colspan="2">Nº 032/2023</td> <td colspan="2">VALOR DO CONTRATO ADITADO</td> <td colspan="2">% TOTAL</td> <td colspan="2">0,00%</td>		CONTRATO:		Nº 032/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		% TOTAL		0,00%			
DATA DE ENVIO:		04/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE <td colspan="2">PROCESSO:</td> <td colspan="2">Nº 025/2023</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>		PROCESSO:		Nº 025/2023									
PERÍODO:		02/02/2024	VALOR DO CONTRATO:		R\$		2.213.304,51		% ACUMULADO		56,66%					
SINAP PE 09/2023 - NÃO DESONERADA, SICRO 07/2023 - NÃO DESONERADA, OFSE 09/2023, COMPESS 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS <td>04/03/2024</td> <td colspan="2">VFD DO NO PERÍODO:</td> <td colspan="2">R\$</td> <td colspan="2">120.963,87</td> <td colspan="2">% DESTA BM</td> <td colspan="2">5,97%</td> <td colspan="2"></td>		04/03/2024	VFD DO NO PERÍODO:		R\$		120.963,87		% DESTA BM		5,97%					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO				FÍSICO				FINANCEIRO				
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	
5.6.7	Composições Próprias	COMP-19.04.040 PMSLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	70,73	-	-	70,73	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.423,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.423,57
5.6.8	SINAP	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 17/2020	UN	5,00	-	-	5,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.318,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.318,20
6			RUA MANOEL REIS										R\$ 229.637,56	R\$ 63.345,04	R\$ 207.954,85	R\$ 21.682,67
6.1			DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/RECOMPOSIÇÕES										R\$ 2.301,28	R\$ -	R\$ 2.301,28	R\$ -
6.1.1	Composições Próprias	CP-500021-PMSLM	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE- MOLDADO	m	20,00	-	20,00	-	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 283,00	R\$ -	R\$ 283,00	R\$ -
6.1.2	Composições Próprias	CP-14.01.16-PMSLM	DEMOLICAO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	M2	20,00	-	20,00	-	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 619,20	R\$ -	R\$ 619,20	R\$ -
6.1.3	Composições Próprias	CP-19.07.580-PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	12,00	-	12,00	-	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.399,08	R\$ -	R\$ 1.399,08	R\$ -
6.2			MOVIMENTO DE TERRA										R\$ 5.638,50	R\$ -	R\$ 5.638,50	R\$ 3,36
6.2.1	SINAP	100516	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	600,96	-	600,60	0,36	0,00%	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 1.935,09	R\$ -	R\$ 1.935,09	R\$ 1,15
6.2.2	Composições Próprias	CP-19322-PMSLM	CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROSCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³. MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	150,24	-	150,15	0,09	0,00%	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 1.035,15	R\$ -	R\$ 1.035,15	R\$ 0,62
6.2.3	SINAP	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KV (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	901,44	-	900,90	0,54	0,00%	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 2.668,26	R\$ -	R\$ 2.668,26	R\$ 1,59
6.3			PAVIMENTAÇÃO										R\$ 103.909,25	R\$ 42.053,70	R\$ 96.756,51	R\$ 7.152,73
6.3.1	SINAP	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	63,79	-	63,78	0,01	0,00%	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 12.899,61	R\$ -	R\$ 12.897,59	R\$ 2,02
6.3.2	SINAP	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	531,62	330,00	484,00	47,62	62,00%	91,00%	91,00%	8,00%	R\$ 55.283,16	R\$ 34.316,70	R\$ 50.331,16	R\$ 4.952,00
6.3.3	SINAP	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	231,14	-	231,00	0,14	0,00%	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 16.526,51	R\$ -	R\$ 16.516,50	R\$ 10,01
6.3.4	Composições Próprias	CP-502622-PMSLM	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	27,60	-	-	27,60	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.613,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.613,22
6.3.5	SINAP	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MO. DADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	231,14	150,00	220,00	11,14	64,00%	95,00%	95,00%	4,00%	R\$ 11.922,20	R\$ 7.737,00	R\$ 11.347,60	R\$ 574,60
6.3.6	SINAP	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KV (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.913,70	-	1.913,40	0,30	0,00%	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 5.664,55	R\$ -	R\$ 5.663,66	R\$ 0,88
6.4			URBANIZAÇÃO										R\$ 37.347,47	R\$ 13.318,99	R\$ 32.154,66	R\$ 5.192,80
6.4.1	SINAP	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	10,40	3,10	3,10	7,30	29,00%	29,00%	29,00%	70,00%	R\$ 1.033,55	R\$ 308,07	R\$ 308,07	R\$ 725,47
6.4.2	SINAP	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF. 08/2017	M3	3,46	0,39	0,39	3,07	11,00%	11,00%	11,00%	88,00%	R\$ 2.437,39	R\$ 274,73	R\$ 274,73	R\$ 2.162,66
6.4.3	Composições Próprias	CP-C0074-PMSLM	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	69,34	69,34	69,34	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 9.932,95	R\$ 9.932,95	R\$ 9.932,95	R\$ -
6.4.4	SINAP	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	M2	46,22	46,22	46,22	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 384,55	R\$ 384,55	R\$ 384,55	R\$ -
6.4.5	SINAP	87794	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 09/2022	M2	52,33	46,22	46,22	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 2.418,69	R\$ 2.418,69	R\$ 2.418,69	R\$ -
6.4.6	SINAP	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF. 08/2023	M3	52,00	-	51,98	0,02	0,00%	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 4.836,00	R\$ -	R\$ 4.834,14	R\$ 1,86
6.4.7	SINAP	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	M3	17,32	-	16,46	0,86	0,00%	0,00%	95,00%	4,00%	R\$ 14.733,08	R\$ -	R\$ 14.001,53	R\$ 731,55
6.4.8	SINAP	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2023	M2	9,76	-	-	9,76	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.571,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.571,26
6.5			SINALIZAÇÃO										R\$ 6.345,55	R\$ 5.050,75	R\$ 5.050,75	R\$ 1.294,80


José Severino da Silva
 Tecnólogo em Contabilidade
 Civil-Edifício 3905
 Responsável ou Responsável Técnico
 Empresa Contratada
 Registro: 1811335


 Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico Pela Fiscalização
 Djailson Pereira de Oliveira
 CRT-PE: 181613657-3

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA <th colspan="2">ADITIVO DE VALOR:</th> <th colspan="2">% ADITADO</th> <td colspan="2">0,00%</td>		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO		0,00%		
TERMINO PREVISTO:		24/07/2024		PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		VIGÊNCIA:		CONCORRÊNCIA: 013/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO		0,00%		
PRazo DE EXECUÇÃO:		210 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 032/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		% TOTAL		0,00%		
DATA DE EMISSÃO:		04/03/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:		Nº 025/2023		%		%				
PERÍODO:		02/02/2024		ENDREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 2.213.304,51		%		%				
		04/03/2024		EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapamento, Pavimentação e Praças)		MED NO PERÍODO:		R\$ 120.963,87		%		%				
		NÃO DESCRITIVA, OBRA 07/2023 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				BDI		20,97%		%		%				
ITEM	FORNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
6.5.1	Composições Próprias	CP-73916/002-PMSLM	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	R\$ 111,43	7,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 222,86	R\$	-	R\$ 222,86
6.5.2	SINAP	102498	PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAUAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,92	231,14	-	-	231,14	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 443,78	R\$	-	R\$ 443,78
6.5.3	Composições Próprias	CP-40931-PMSLM	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	M2	R\$ 332,72	13,80	13,20	13,20	0,60	95,00%	95,00%	4,00%	R\$ 4.591,53	R\$	4.391,90	R\$ 199,63
6.5.4	SINAP	97092	ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO DUA 1:1 AF SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q. 196. AF_09/2021	KG	R\$ 16,05	42,91	41,05	41,05	1,86	95,00%	95,00%	4,00%	R\$ 688,70	R\$	658,85	R\$ 29,85
6.5.5	SINAP	102509	TUBO DE FAIXA DE PEDIESTRE OU TUBADA TINTA RETORRE FLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROSFERAS DE VIDRO, F. = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	R\$ 28,89	13,80	-	-	13,80	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 398,68	R\$	-	R\$ 398,68
6.6			DRENAGEM													
6.6.1	SINAP	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,1X2 M. AF_12/2020	UN	R\$ 1.649,26	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.298,52	R\$	-	R\$ 3.298,52
6.6.2	SINAP	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLTUBAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORRIMENTO E ASSEIAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 314,28	7,00	-	-	7,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.199,96	R\$	-	R\$ 2.199,96
6.6.3	SICHO NOVO	2003385	Entrada para descida d'água - LDA 01 - areia e brita comerciais	un	R\$ 65,54	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 65,54	R\$	-	R\$ 65,54
6.6.4	SICHO NOVO	2003391	Bacia de dissipação LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPa, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAS E FÓRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	m	R\$ 189,01	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 567,03	R\$	-	R\$ 567,03
6.6.5	SINAP	103930	CONTENÇÃO	M3	R\$ 912,53	0,49	-	-	0,49	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 447,13	R\$	-	R\$ 447,13
6.7			CONTENÇÃO													
6.7.1	SINAP	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MEIOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 99,38	42,05	-	42,05	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 4.178,92	R\$	-	R\$ 4.178,92
6.7.2	SINAP	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	R\$ 704,45	2,90	-	2,90	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 2.042,90	R\$	-	R\$ 2.042,90
6.7.3	SINAP	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSEIAMENTO. AF_08/2022	M3	R\$ 572,24	87,15	-	87,15	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 49.870,71	R\$	-	R\$ 49.870,71
6.7.4	SINAP	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	R\$ 36,52	120,00	80,00	80,00	40,00	66,00%	66,00%	33,00%	R\$ 4.382,40	R\$	2.921,60	R\$ 1.460,80
6.7.5	SINAP	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KV (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,96	2.379,19	-	2.379,19	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 7.042,40	R\$	-	R\$ 7.042,40
7			RUA PHILEA QUEIROZ MONTEIRO													
7.1			DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/RECOMPOSIÇÕES													
7.1.1	Composições Próprias	CP-500021-PMSLM	DEMOLIÇÃO DE MEO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO	m	R\$ 14,15	20,00	-	20,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 283,00	R\$	-	R\$ 283,00
7.1.2	Composições Próprias	CP-14.01.16-PMSLM	DEMOLICAO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	M2	R\$ 30,96	20,00	-	20,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 619,20	R\$	-	R\$ 619,20
7.1.3	Composições Próprias	CP-19.07.580-PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	R\$ 116,59	12,00	-	12,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.399,08	R\$	-	R\$ 1.399,08
7.2			MOVIMENTO DE TERRA													
7.2.1	SINAP	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	R\$ 3,22	650,61	-	646,88	3,73	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 2.094,96	R\$	-	R\$ 2.094,96
7.2.2	Composições Próprias	CP-19322-PMSLM	CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADORA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	R\$ 6,89	162,65	-	162,65	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.120,65	R\$	-	R\$ 1.120,65
7.2.3	SINAP	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KV (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,96	975,91	-	975,90	0,01	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 2.888,69	R\$	-	R\$ 2.888,69
7.3			PAVIMENTAÇÃO													
7.3.1	SINAP	96396	EXECUÇÃO F COMPACTAÇÃO DE BASE F E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 202,22	69,11	-	69,04	0,07	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 13.975,42	R\$	-	R\$ 13.975,42
7.3.2	SINAP	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 103,99	575,97	-	575,97	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 59.895,17	R\$	-	R\$ 59.895,17

José Severino da Silva
Tecnólogo em Computação
Civil-Edificações
Registro: 18/2011
Responsável Técnico
Empresa Contratada

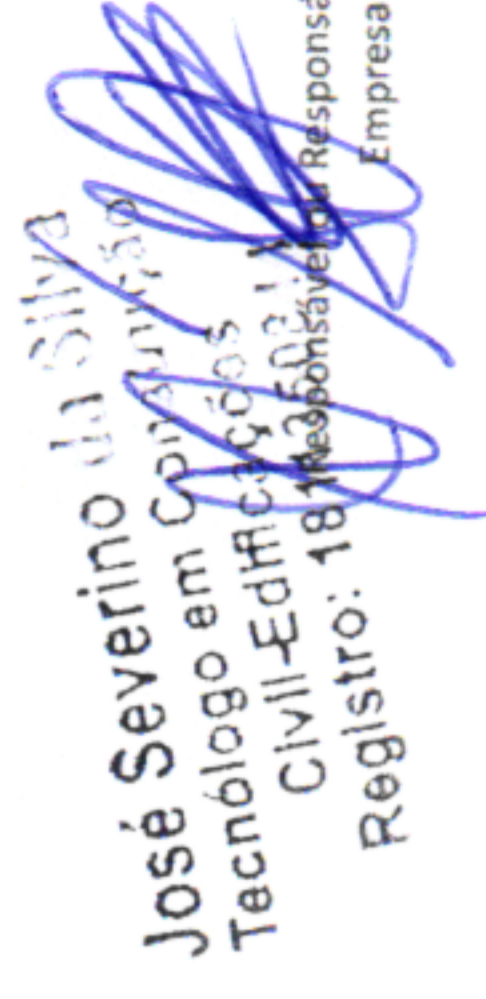
Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz


Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO		0,00%	
TERMINO PREVISTO:		24/07/2024		PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 013/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO		0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - D. RETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 032/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 2.213.304,51		% TOTA	
DATA DE ENVIO:		06/03/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:		Nº 025/2023		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 2.213.304,51			
PERÍODO:		02/02/2024		ENDREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 120.963,87		% ACUMULADO		56,66%			
SINAPI 09/2023 - NÃO DESONERADA, SICRO 07/2023 - NÃO DESONERADA, OBSE 08/2023, COMPESA 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapamento, Pavimentação e Praças)		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 120.963,87		% DESTA RM		5,47%			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO					
				PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	
7.3.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COM PRIMEIRO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	248,80	-	248,80	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 17.789,20	R\$ -	R\$ 17.789,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.3.4	Composições Próprias	CP-502622-PMSIM	MÉDIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	32,41	-	17,10	52,00%	52,00%	47,00%	R\$ 1.894,36	R\$ -	R\$ 1.894,36	R\$ -	R\$ 999,49	R\$ 894,86
7.3.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	248,80	-	248,80	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 12.833,10	R\$ -	R\$ 12.833,10	R\$ -	R\$ 12.833,10	R\$ -
7.3.6	SINAPI	93875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KV (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2.073,30	-	2.071,20	99,00%	99,00%	0,00%	R\$ 6.136,96	R\$ -	R\$ 6.136,96	R\$ -	R\$ 6.136,96	R\$ 6,21
7.4			URBANIZAÇÃO												
7.4.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MELHOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	11,18	8,82	11,18	78,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.111,06	R\$ 876,53	R\$ 1.111,06	R\$ 876,53	R\$ 1.111,06	R\$ -
7.4.2	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	3,72	0,61	1,40	16,00%	37,00%	62,00%	R\$ 2.620,55	R\$ 429,71	R\$ 986,23	R\$ 429,71	R\$ 1.634,32	R\$ -
7.4.3	Composições Próprias	CP-00074-PMSIM	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	74,64	58,81	74,56	78,00%	99,00%	0,00%	R\$ 10.692,18	R\$ 8.424,53	R\$ 10.690,72	R\$ 8.424,53	R\$ 11,46	R\$ -
7.4.4	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	49,76	41,81	49,69	84,00%	99,00%	0,00%	R\$ 414,00	R\$ 347,85	R\$ 413,42	R\$ 347,85	R\$ 0,58	R\$ -
7.4.5	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	49,76	41,81	49,69	84,00%	99,00%	0,00%	R\$ 2.603,94	R\$ 2.187,91	R\$ 2.600,27	R\$ 2.187,91	R\$ 3,66	R\$ -
7.4.6	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-AREÍOSO. AF_08/2023	55,98	-	55,98	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 5.206,14	R\$ -	R\$ 5.206,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.4.7	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	18,66	-	18,66	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 15.872,94	R\$ -	R\$ 15.872,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.4.8	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	19,92	-	19,92	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 3.206,92	R\$ -	R\$ 3.206,92	R\$ -	R\$ 3.206,92	R\$ -
7.5			SINALIZAÇÃO												
7.5.1	Composições Próprias	CP-73916/002-PMSIM	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 222,86	R\$ -	R\$ 222,86	R\$ -	R\$ 222,86	R\$ -
7.5.2	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇADA). AF_05/2021	248,80	-	248,80	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 477,69	R\$ -	R\$ 477,69	R\$ -	R\$ 477,69	R\$ -
7.5.3	Composições Próprias	CP-103701-PMSIM	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/2022	2,57	-	2,57	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.850,86	R\$ -	R\$ 1.850,86	R\$ -	R\$ 1.850,86	R\$ -
7.5.4	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	6,00	-	6,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 644,28	R\$ -	R\$ 644,28	R\$ -	R\$ 644,28	R\$ -
7.5.5	Composições Próprias	CP-40931-PMSIM	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	13,89	13,20	13,20	95,00%	95,00%	4,00%	R\$ 4.621,48	R\$ 4.391,90	R\$ 4.391,90	R\$ 4.391,90	R\$ 229,57	R\$ -
7.5.6	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	43,17	41,05	41,05	95,00%	95,00%	4,00%	R\$ 692,87	R\$ 658,85	R\$ 658,85	R\$ 658,85	R\$ 34,02	R\$ -
7.5.7	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	13,89	-	13,89	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 401,28	R\$ -	R\$ 401,28	R\$ -	R\$ 401,28	R\$ -
7.6			DRENAGEM												
7.6.1	Composições Próprias	COMP-19.04.040-PMSIM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	161,80	-	161,80	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 12.406,82	R\$ -	R\$ 12.406,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.6.2	SINAPI	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	9,00	-	9,00	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 2.372,76	R\$ -	R\$ 2.372,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8			RUA SOUTO MAIOR JÚNIOR												
8.1			DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/RECOMPOSIÇÕES												
8.1.1	Composições Próprias	CP-S00021-PMSIM	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	9,55	9,55	9,55	99,00%	99,00%	0,00%	R\$ 135,55	R\$ 135,13	R\$ 135,13	R\$ 135,13	R\$ 0,42	R\$ -
8.1.2	Composições Próprias	CP-14.01.16-PMSIM	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	14,36	14,33	14,33	99,00%	99,00%	0,00%	R\$ 444,58	R\$ 443,65	R\$ 443,65	R\$ 443,65	R\$ 0,92	R\$ -


José Severino da Silva
 Tecnólogo em Computação
 Civil-Edificações
 Registro: 18.183.503-1
 Responsável Técnico
 Empresa Contratada

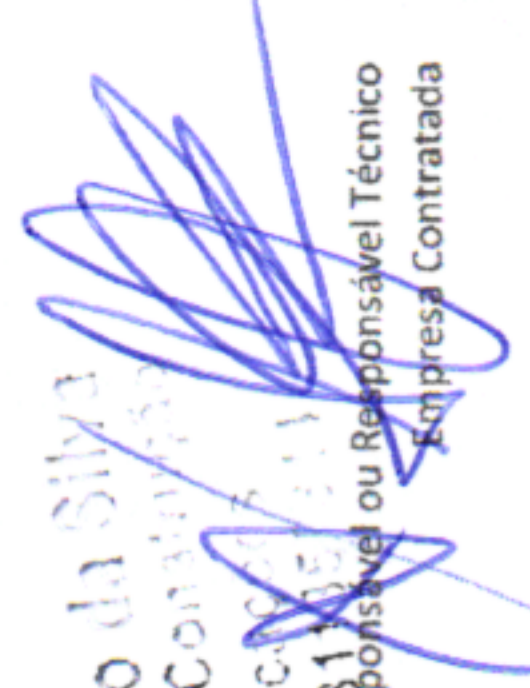

Tarcísio Cruz Muniz
 Secretário de Infraestrutura


Responsável Técnico Pela Fiscalização
 Djalison Pereira de Oliveira
 CRT-PE: 181613657-3



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO		0,00%	
TÉRMINO PREVISTO:		24/07/2024		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		VIGÊNCIA:		CONCORRÊNCIA: 013/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO		0,00%	
PRazo DE EXECUÇÃO:		210 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 032/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		% TOTAL		2.213.304,51	
DATA DE EMISSÃO:		04/03/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:		Nº 025/2023		VALOR DO CONTRATO:		R\$		56,86%	
PERÍODO:		02/02/2024 a 04/03/2024		ENDREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MED DO NO PERÍODO:		R\$		VALOR DO CONTRATO: <td colspan="2">R\$</td> <td colspan="2">5,47%</td>		R\$		5,47%	
SINAP Nº 09/2023 - NÃO DESONERADA, SIC Nº 07/2023 - NÃO DESONERADA, ORSE 09/2023, COMPSA 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrôvias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO					
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	
8.1.3	Composições Próprias	CP-19.07.580-PMSLM	REBAIXAMENTO DE PNE DA ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	14,00	14,00	14,00	0,00%	0,00%	R\$	1.632,26	R\$	1.632,26	R\$	-
8.2			MOVIMENTO DE TERRA							R\$	3.959,77	R\$	3.959,77	R\$	-
8.2.1	SINAP	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	422,04	422,04	422,04	0,00%	0,00%	R\$	1.358,96	R\$	1.358,96	R\$	-
8.2.2	Composições Próprias	CP-19322-PMSIM	CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROSCAVADORA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³. MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	105,51	105,51	105,51	0,00%	0,00%	R\$	726,96	R\$	726,96	R\$	-
8.2.3	SINAP	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KV (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	633,06	633,06	633,06	0,00%	0,00%	R\$	1.873,85	R\$	1.873,85	R\$	-
8.3			PAVIMENTAÇÃO							R\$	76.293,09	R\$	12.542,96	R\$	63.750,13
8.3.1	SINAP	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE, PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	43,10	43,10	43,10	0,00%	0,00%	R\$	8.715,68	R\$	8.715,68	R\$	-
8.3.2	SINAP	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	342,23	342,23	342,23	0,00%	0,00%	R\$	35.588,49	R\$	35.588,49	R\$	-
8.3.3	SINAP	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	209,08	209,08	209,08	0,00%	0,00%	R\$	14.949,22	R\$	14.949,22	R\$	-
8.3.4	Composições Próprias	CP-502622-PMSLM	MEIO FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	10,00	10,00	10,00	0,00%	0,00%	R\$	584,50	R\$	584,50	R\$	-
8.3.5	SINAP	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	209,08	209,08	209,08	0,00%	0,00%	R\$	10.784,34	R\$	10.784,34	R\$	-
8.3.6	SINAP	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KV (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.293,00	1.293,00	1.293,00	0,00%	0,00%	R\$	3.827,28	R\$	3.827,28	R\$	-
8.3.7	SINAP	101852	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	19,40	19,40	19,40	0,00%	0,00%	R\$	1.843,58	R\$	1.843,58	R\$	-
8.4			URBANIZAÇÃO							R\$	28.586,95	R\$	28.586,95	R\$	-
8.4.1	SINAP	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	9,40	9,40	9,40	0,00%	0,00%	R\$	934,17	R\$	934,17	R\$	-
8.4.2	SINAP	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	3,12	3,12	3,12	0,00%	0,00%	R\$	2.197,88	R\$	2.197,88	R\$	-
8.4.3	Composições Próprias	CP-C0074-PMSLM	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	62,72	62,72	62,72	0,00%	0,00%	R\$	8.984,64	R\$	8.984,64	R\$	-
8.4.4	SINAP	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	41,80	41,80	41,80	0,00%	0,00%	R\$	347,77	R\$	347,77	R\$	-
8.4.5	SINAP	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÁZIOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	41,80	41,80	41,80	0,00%	0,00%	R\$	2.187,39	R\$	2.187,39	R\$	-
8.4.6	SINAP	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	M3	31,36	31,36	31,36	0,00%	0,00%	R\$	2.916,48	R\$	2.916,48	R\$	-
8.4.7	SINAP	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	10,44	10,44	10,44	0,00%	0,00%	R\$	8.880,68	R\$	8.880,68	R\$	-
8.4.8	SINAP	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	13,28	13,28	13,28	0,00%	0,00%	R\$	2.137,94	R\$	2.137,94	R\$	-
8.5			SINALIZAÇÃO							R\$	4.821,48	R\$	4.821,48	R\$	-
8.5.1	Composições Próprias	CP-73916/007-PMSLM	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00%	R\$	222,86	R\$	222,86	R\$	-
8.5.2	SINAP	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇADA). AF_05/2021	M	209,08	209,08	209,08	0,00%	0,00%	R\$	401,43	R\$	401,43	R\$	-
8.5.3	Composições Próprias	CP-40931-PMSLM	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	M2	10,20	10,20	10,20	0,00%	0,00%	R\$	3.393,74	R\$	3.393,74	R\$	-
8.5.4	SINAP	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	31,70	31,70	31,70	0,00%	0,00%	R\$	508,78	R\$	508,78	R\$	-


José Severino da Silva
 Tecnólogo em Contabilidade
 Civil-Edição Nº 18106/2011
 Registro: Responsável ou Responsável Técnico
 Empresa Contratada


 Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico Pela Fiscalização
 Djalison Pereira de Oliveira
 CRT-PE: 181613657-3



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:		0,00%			
TERMINO PREVISTO:		24/07/2024		PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		VOZAL / DADE:		CONCORRÊNCIA: 013/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		0,00%			
PRATO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 032/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO:		R\$ 2.213.304,51			
DATA DE ENVIO:		04/03/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:		Nº 025/2023		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 56,66%			
PERÍODO:		02/02/2024 - 04/03/2024		FIM DO PERÍODO:		R\$ 2.213.304,51		R\$ 120.963,87		% ACUMULADO:		5,47%			
SINAP PE 09/2023 - NÃO DESONERADA, SICRO 07/2023 - NÃO DESONERADA, OFSE 09/2023, COMPESA 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS <td colspan="2"></td> <td colspan="2">EMPREENHAMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapamento, Pavimentação e Praças)</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">% DESTA RM</td> <td colspan="2"></td>				EMPREENHAMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapamento, Pavimentação e Praças)						% DESTA RM					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO				FÍSICO				FINANCEIRO			
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
8.5	SINAP	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E - 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	10,20	-	10,20	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 294,67	R\$ -	R\$ 294,67		
8.6	Composições Próprias		DRENAGEM	M	35,37	-	35,37	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 8.373,01	R\$ -	R\$ 8.373,01		
8.6.1	SINAP	92212	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLIDAVITS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	5,00	-	5,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.571,40	R\$ -	R\$ 1.571,40		
8.6.2	SINAP	92528	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 790,92	R\$ -	R\$ 790,92		
8.6.3	SINAP	97956	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA RUDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.298,52	R\$ -	R\$ 3.298,52		
8.6.4	SINAP	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,2 X 1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 124.045,07	R\$ -	R\$ 124.045,07		
8.7	Composições Próprias		CONTENÇÃO	M3	75,14	-	75,14	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 7.467,41	R\$ -	R\$ 7.467,41		
8.7.1	SINAP	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,52	-	6,52	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 4.593,01	R\$ -	R\$ 4.593,01		
8.7.2	SINAP	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	159,96	-	159,96	0,00%	0,00%	46,00%	R\$ 91.535,51	R\$ -	R\$ 91.535,51		
8.7.3	SINAP	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	206,00	-	206,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 7.523,12	R\$ -	R\$ 7.523,12		
8.7.4	SINAP	102724	DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	4.366,90	-	4.366,90	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 12.926,02	R\$ -	R\$ 12.926,02		
8.7.5	SINAP	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KV. (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		-		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 139.752,94	R\$ 13.984,63	R\$ 20.108,45		
9	Composições Próprias		DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/RECOMPOSIÇÕES								R\$ 1.104,80	R\$ -	R\$ 1.104,80		
9.1	Composições Próprias		DEMOLUÇÃO DE MEO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	15,00	-	15,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 212,25	R\$ -	R\$ 212,25		
9.1.1	SINAP	CP-500021	DEMOLUÇÃO DE MEO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M2	10,00	-	10,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 309,60	R\$ -	R\$ 309,60		
9.1.2	SINAP	CP-14.01.16	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	5,00	-	5,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 582,95	R\$ -	R\$ 582,95		
9.1.3	SINAP	CP-19.07.580	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 4.362,86	R\$ -	R\$ 4.362,86		
9.2	Composições Próprias		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	465,00	-	465,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.497,30	R\$ -	R\$ 1.497,30		
9.2.1	SINAP	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	116,25	-	116,25	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 800,96	R\$ -	R\$ 800,96		
9.2.2	SINAP	CP-19322	CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROSCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	697,50	-	697,50	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 2.064,60	R\$ -	R\$ 2.064,60		
9.2.3	SINAP	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KV. (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		-		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 81.277,74	R\$ -	R\$ 81.277,74		
9.3	Composições Próprias		PAVIMENTAÇÃO								R\$ 76.074,22	R\$ -	R\$ 76.074,22		
9.3.1	SINAP	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	49,10	-	49,10	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 9.929,00	R\$ -	R\$ 9.929,00		
9.3.2	SINAP	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	409,20	-	409,20	0,00%	0,00%	8,00%	R\$ 42.552,70	R\$ -	R\$ 42.552,70		
9.3.3	SINAP	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	186,00	-	186,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 13.299,00	R\$ -	R\$ 13.299,00		
9.3.4	Composições Próprias		MEO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	26,40	-	26,40	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.543,08	R\$ -	R\$ 1.543,08		
9.3.5	SINAP	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	186,00	-	186,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 9.593,88	R\$ -	R\$ 9.593,88		
9.3.6	SINAP	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KV. (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		-		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 4.360,08	R\$ -	R\$ 4.360,08		
9.4	Composições Próprias		URBANIZAÇÃO								R\$ 29.581,52	R\$ 7.477,12	R\$ 22.321,12		
											R\$ 29.581,52	R\$ 7.477,12	R\$ 22.321,12		
											R\$ 29.581,52	R\$ 7.477,12	R\$ 22.321,12		

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalilson Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Responsável ou Responsável Técnico
Civil-Edificação
Registro: 181613657-3
José Severino
Tecnólogo em Engenharia de Edificações
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:		0,00%			
TERMINO PREVISTO:		24/07/2024		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 013/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		0,00%			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 032/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 2.213.304,51			
DATA DE ENVIO:		06/03/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:		Nº 025/2023		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 56,66%			
PERÍODO:		06/03/2024		ENDREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 2.213.304,51		% ACUMULADO		56,66%			
SINAPI PE 09/2023 - NÃO DESONERADA, SICRO 07/2023 - NÃO DESONERADA, OBR 09/2023, COMPESA 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						MED DO PERÍODO:		R\$ 120.963,87		% DESTA BM		5,47%			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO				FÍSICO				FINANCEIRO			
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
9.4.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	8,36	-	4,41	3,95	0,00%	0,00%	47,00%	R\$ 830,81	R\$ 438,26	R\$ 392,55	
9.4.2	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	2,78	-	1,48	1,30	0,00%	0,00%	46,00%	R\$ 1.958,37	R\$ 1.042,58	R\$ 915,78	
9.4.3	Composições Próprias	CP-0074-PMSLM	ALVENARIA DE TIPO C/ RÁMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-20 cm	M2	55,80	-	55,80	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 7.993,35	R\$ 7.993,35	R\$ -	
9.4.4	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TIPO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	37,20	-	37,20	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 309,50	R\$ 309,50	R\$ -	
9.4.5	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TIPO 1:3. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PISOS, LAJES DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPISSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	37,20	-	37,20	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.946,67	R\$ 1.946,67	R\$ -	
9.4.6	SINAPI	94319	ALTIPO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL. AMEUSO. AF_08/2023	M3	33,48	-	33,48	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 3.113,64	R\$ 3.113,64	R\$ -	
9.4.7	SINAPI	94990	EXALCUÇÃO DE PASSELO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	13,94	8,79	8,79	5,15	63,00%	63,00%	36,00%	R\$ 11.857,92	R\$ 7.477,12	R\$ 4.380,79	
9.4.8	SINAPI	104658	PISO PODOIÁTIL DE ALERTIA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSEIADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	9,76	-	-	9,76	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.571,26	R\$ -	R\$ 1.571,26	
9.5			SINALIZAÇÃO												
9.5.1	Composições Próprias	CP-73916/002-PMSLM	PLACA ESMAIADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25CM	UN	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 222,86	R\$ -	R\$ 222,86	
9.5.2	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAUÇÃO). AF_05/2021	M	186,00	-	-	186,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 357,12	R\$ -	R\$ 357,12	
9.5.3	Composições Próprias	CP-46931-PMSLM	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	M2	13,20	13,20	13,20	-	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 4.391,90	R\$ 4.391,90	R\$ -	
9.5.4	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	41,04	41,04	41,04	-	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 658,69	R\$ 658,69	R\$ -	
9.5.5	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	13,20	-	-	13,20	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 381,34	R\$ -	R\$ 381,34	
9.6			DRENAGEM												
9.6.1	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.298,52	R\$ -	R\$ 3.298,52	
9.6.2	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	7,00	-	-	7,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.199,96	R\$ -	R\$ 2.199,96	
9.6.3	SICRO NOVO	2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 65,54	R\$ -	R\$ 65,54	
9.6.4	SICRO NOVO	2003391	BACIA DE DISSIPACÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, TCK = 20 MPa, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÓRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	m	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 567,03	R\$ -	R\$ 567,03	
9.6.5	SINAPI	103930	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40x0,40 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	M3	0,49	-	-	0,49	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 447,13	R\$ -	R\$ 447,13	
9.6.6	SINAPI	99258	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	UN	9,00	-	9,00	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 2.372,76	R\$ 2.372,76	R\$ -	
9.6.7	Composições Próprias	COMP-19.04.040-PMSLM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M	110,37	19,00	109,00	1,37	17,00%	98,00%	1,00%	R\$ 8.463,17	R\$ 1.456,92	R\$ 105,05	
10			ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.680,00	90,00	943,00	737,00	5,00%	56,00%	43,00%	R\$ 64.646,40	R\$ 3.463,20	R\$ 28.359,76	
10.1	SINAPI	90776	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	115,47	31,00	324,00	252,00	5,00%	56,00%	43,00%	R\$ 66.512,72	R\$ 3.579,57	R\$ 29.098,44	
10.2	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	115,47	31,00	324,00	252,00	5,00%	56,00%	43,00%	R\$ 66.512,72	R\$ 3.579,57	R\$ 29.098,44	
TOTAL DA MEDIÇÃO				cento e vinte mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos				TOTAL GERAL				R\$ 120.963,87			
												R\$ 1.253.997,37			
												R\$ 959.307,11			

DJAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA:03860295470
 95470
 Assinado de forma digital por DJAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA:03860295470
 Dados: 2024.03.04 10:39:19 -03'00'

Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz

José Severino da Silva
 Tecnólogo em Contabilidade
 Civil-Edificação
 Registro: 181135031
 Responsável ou Responsável Técnico
 Empresa Contratada

Responsável Técnico Pela Fiscalização
 Djailson Pereira de Oliveira
 CRT-PE: 181613657-3
