

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

RUMO AO DESENVOLVIMENTO																													
INÍCIO DA OBRA:		07/03/2024		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		BARROS CONSTRUÇÕES LTDA		ADITIVO DE VALOR:		R\$																	
TÉRMINO PREVISTO:		03/03/2025		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		-R\$																	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		360 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 014/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$																	
DATA DE EMISSÃO:		19/02/2025		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		PROCESSO:		Nº 009/2023		% ACUMULADO		64,81%																	
PERÍODO:		04/01/2025		ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		VALOR DO CONTRATO:		R\$		% DESTE BMI		8,13%																	
SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA																													
				EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		BDI		22,35%		QUANTITATIVO																			
						UNID.		PREÇO UNITÁRIO		PREVISTO		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO		PREVISTO		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO					
ITEM	FONTE	CÓDIGO		DESCRIÇÃO																									
1.0				ADMINISTRAÇÃO LOCAL																									
1.1	SINAPI 12/2022	90777		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H		R\$ 131,37		177,60		-		71,20		106,40		40,00%		0,00%		59,00%		R\$ 36.973,87		R\$ 21.101,30		R\$ 15.872,56	
1.2	SINAPI 12/2022	90776		ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H		R\$ 47,37		288,00		-		248,00		40,00		86,00%		0,00%		13,00%		R\$ 13.642,56		R\$ 11.747,76		R\$ 1.894,80	
2.0				SERVIÇOS PRELIMINARES/ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS																									
2.1	COMPOSIÇÃO	003		PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA		M2		R\$ 476,11		12,00		-		12,00		-		100,00%		0,00%		0,00%		R\$ 5.713,32		R\$ 5.713,32		R\$ -	
2.2	INSUMO 12/2022	10527		LOCALAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)		MXMMES		R\$ 17,74		40,00		-		40,00		-		100,00%		0,00%		0,00%		R\$ 709,60		R\$ 709,60		R\$ -	
2.3	SINAPI 12/2022	97064		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORREZ (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF_11/2017		M		R\$ 26,37		40,00		-		40,00		-		100,00%		0,00%		0,00%		R\$ 1.054,80		R\$ 1.054,80		R\$ -	
3.0				PRAÇA BELA VISTA																									
3.1.0				DEMOLICOES E RETIRADAS																									
3.1.1	COMPOSIÇÃO	001		REMOCAO DE TUBO GALVANIZADO, BITOLAS DIVERSAS		M		R\$ 9,23		124,00		-		124,00		-		100,00%		0,00%		0,00%		R\$ 1.144,52		R\$ 1.144,52		R\$ -	
3.1.2	COMPOSIÇÃO	006		REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA		M2		R\$ 4,99		310,00		-		310,00		-		100,00%		0,00%		0,00%		R\$ 1.546,90		R\$ 1.546,90		R\$ -	
3.1.3	COMPOSIÇÃO	008		REMOÇÃO DE TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA/ALAMBRAO/QUADRA DE ESPORTES		M2		R\$ 1,24		220,00		-		220,00		-		100,00%		0,00%		0,00%		R\$ 272,80		R\$ 272,80		R\$ -	
3.1.4	SINAPI 12/2022	97622		DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		M3		R\$ 63,82		3,64		-		3,63		0,01		99,00%		0,00%		0,00%		R\$ 232,30		R\$ 231,66		R\$ 0,63	
3.1.5	ORSE 11/2022	7768		REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6,00 a 10,00 m) SEM REAPROVEITAMENTO		UN		R\$ 38,16		1,00		-		1,00		-		100,00%		0,00%		0,00%		R\$ 38,16		R\$ 38,16		R\$ -	
3.1.6	ORSE 11/21	7228		REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO		UN		R\$ 20,32		1,00		-		1,00		-		100,00%		0,00%		0,00%		R\$ 20,32		R\$ 20,32		R\$ -	
3.1.7	COMPOSIÇÃO	007		DEMOLUÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - Rev 01		M2		R\$ 36,52		322,17		-		322,17		-		100,00%		0,00%		0,00%		R\$ 11.765,64		R\$ 11.765,64		R\$ -	
3.1.8	COMPOSIÇÃO	013		DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA		M3		R\$ 112,35		36,00		-		36,00		-		100,00%		0,00%		0,00%		R\$ 4.044,60		R\$ 4.044,60		R\$ -	
3.1.9	SINAPI 12/2022	100974		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		M3		R\$ 10,43		60,50		-		60,50		-		100,00%		0,00%		0,00%		R\$ 631,01		R\$ 631,01		R\$ -	
3.1.10	SINAPI 12/2022	93589		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XKM		R\$ 3,25		387,15		-		387,15		-		100,00%		0,00%		0,00%		R\$ 1.258,23		R\$ 1.258,23		R\$ -	
3.2				PRAÇA/ QUADRA- BELA VISTA																									
3.2.1	SINAPI 12/2022	93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021		M3		R\$ 96,93		3,33		-		3,33		-		100,00%		0,00%		0,00%		R\$ 322,77		R\$ 322,77		R\$ -	
3.2.2	SINAPI 12/2022	98524		LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018		M2		R\$ 3,70		42,00		-		42,00		-		100,00%		0,00%		0,00%		R\$ 155,40		R\$ 155,40		R\$ -	
3.2.3	SINAPI 12/2022	96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017		M3		R\$ 745,22		0,37		-		0,37		-		100,00%		0,00%		0,00%		R\$ 275,73		R\$ 275,73		R\$ -	
3.2.4	COMPOSIÇÃO	014		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2		M3		R\$ 143,77		62,52		-		62,52		-		100,00%		0,00%		0,00%		R\$ 8.988,50		R\$ 8.988,50		R\$ -	
3.2.5	SINAPI 12/2022	103328		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		M2		R\$ 93,78		43,27		-		43,27		-		100,00%		0,00%		0,00%		R\$ 4.057,86		R\$ 4.057,86		R\$ -	
3.2.6	SINAPI 12/2022	87879		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022		M2		R\$ 5,04		149,07		-		149,07		-		100,00%		0,00%		0,00%		R\$ 751,31		R\$ 751,31		R\$ -	
3.2.7	SINAPI 12/2022	87529		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		M2		R\$ 47,25		69,60		-		69,60		-		100,00%		0,00%		0,00%		R\$ 3.288,60		R\$ 3.288,60		R\$ -	
3.2.8	SINAPI 12/2022	102363		ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021		M2		R\$ 237,82		375,70		-		375,70		-		100,00%		49,00%		0,00%		R\$ 89.348,97		R\$ 44.674,48		R\$ -	
3.2.9	COMPOSIÇÃO	005		TELA EM NYLON PARA PROTEÇÃO, MALHA 100MM - FIO 3036 (QUADRA DE ESPORTES)		M2		R\$ 29,24		325,20		-		-		325,20		0,00%		0,00%		100,00%		R\$ 9.508,84		R\$ -		R\$ 9.508,84	
3.2.10	COMPOSIÇÃO	002		REFLETOR LED 200 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN		R\$ 368,56		8,00		-		8,00		-		100,00%		100,00%		0,00%		R\$ 2.948,48		R\$ 2.948,48		R\$ -	

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA/PE 182250063-0


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Viviano V. Viana Rodrigues
Eng. Civil
REA-PE-033247-1
Responsável Técnico
Empresa Contratada




BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

INÍCIO DA OBRA:		07/03/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	BARROS CONSTRUÇÕES LTDA		ADITIVO DE VALOR:		R\$	146.934,21	% ADITADO	24,12%			
TÉRMINO PREVISTO:		03/03/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		-R\$	60.817,17	% SUPRIMIDO	-9,98%			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		360 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 014/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	695.341,98	% TOTAL	14,14%			
DATA DE EMISSÃO:		19/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		PROCESSO:	Nº 009/2023										
PERÍODO:	04/01/2025	31/01/2025	VALOR DO CONTRATO:		MEDIDO NO PERÍODO:	R\$	609.224,94		% ACUMULADO	64,81%						
			ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE			R\$	49.545,60		% DESTA BM	8,13%						
SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA					BDI	22,35%		QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
3.2.11	SINAPI 12/2022	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	R\$ 35,79	52,00	-	52,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.861,08	R\$ -	R\$ 1.861,08	R\$ -
3.2.12	SINAPI 12/2022	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 739,48	2,60	2,60	2,60	-	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.922,64	R\$ 1.922,64	R\$ 1.922,64	R\$
3.2.13	COMPESA 07/2022	08.01.06U	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE TERRENO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO MESMO.	M2	R\$ 109,90	322,17	-	322,17	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 35.406,48	R\$ -	R\$ 35.406,48	R\$ -
3.2.14	INSUMO 12/2022	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 159,05	-	-	-	-				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.15	SINAPI 12/2022	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	R\$ 215,92	7,67	-	7,67	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.656,10	R\$ -	R\$ 1.656,10	R\$ -
3.2.16	COMPOSIÇÃO	012	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	R\$ 826,62	61,82	-	61,82	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 51.101,64	R\$ -	R\$ 51.101,64	R\$ -
3.2.17	ORSE 11/2022	S05103	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	R\$ 5,39	325,20	-	325,20	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.752,82	R\$ -	R\$ 1.752,82	R\$ -
3.2.18	SINAPI 12/2022	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	R\$ 4,55	325,20	-	325,20	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.479,66	R\$ -	R\$ 1.479,66	R\$ -
3.2.19	ORSE 11/2022	S11482	CONCRETO SIMPLES USINADO Fck=25MPa, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	R\$ 579,58	32,52	-	32,52	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 18.847,94	R\$ -	R\$ 18.847,94	R\$ -
3.2.20	SINAPI 12/2022	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	R\$ 23,18	481,30	-	481,29	-	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 11.156,53	R\$ -	R\$ 11.156,53	R\$ -
3.2.21	SINAPI 12/2022	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	R\$ 0,42	139,75	-	139,75	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 58,69	R\$ -	R\$ 58,69	R\$ -
3.2.22	ORSE 11/2022	S07342	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1	M2	R\$ 23,73	325,20	-	325,20	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 7.716,99	R\$ -	R\$ 7.716,99	R\$ -
3.2.23	INSUMO 12/2022	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	R\$ 5.636,02	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.636,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.636,02
3.2.24	SINAPI 12/2022	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	R\$ 11,83	204,40	-	-	204,40	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.418,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.418,05
3.2.25	SINAPI 12/2022	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	R\$ 70,93	325,20	-	-	325,20	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 23.066,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.066,43
3.2.26	ORSE 11/2022	S12945	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3"	M	R\$ 164,23	55,50	-	55,50	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 9.114,76	R\$ -	R\$ 9.114,76	R\$ -
3.2.27	SINAPI 12/2022	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	R\$ 84,67	32,00	-	32,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 2.709,44	R\$ -	R\$ 2.709,44	R\$ -
3.3.0			PINTURA										R\$ 9.534,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.534,89
3.3.1	SINAPI 12/2022	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	R\$ 26,92	51,00	-	-	51,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.372,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.372,92
3.3.2	SINAPI 12/2022	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	R\$ 30,40	102,00	-	-	102,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.100,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.100,80
3.3.3	SINAPI 12/2022	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	R\$ 22,63	20,00	-	-	20,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 452,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 452,60
3.3.4	SINAPI 12/2022	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	R\$ 18,16	227,60	-	-	227,60	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.133,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.133,21
3.3.5	SINAPI 12/2022	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	R\$ 30,40	3,20	-	-	3,20	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 97,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 97,28
3.3.6	SINAPI 12/2022	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,84	132,00	-	-	132,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 242,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 242,88
3.3.7	SINAPI 12/2022	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	R\$ 3,38	40,00	-	-	40,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 135,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,20



Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA/PE 182250063-0

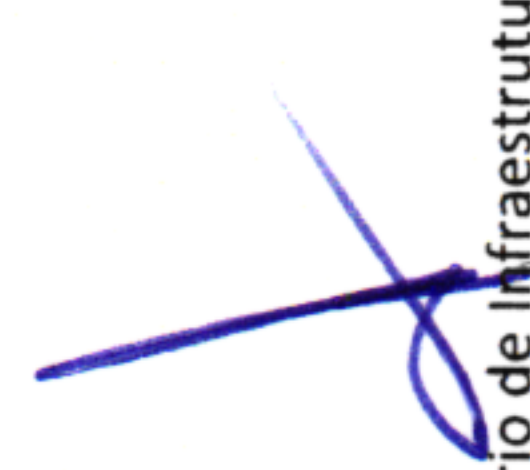

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



Viviane M. Viana Rodrigues
Eng. Civil
CFA-PE-033247-5

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

RUMO AO DESenvolvimento																	
INÍCIO DA OBRA:		07/03/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	BARROS CONSTRUÇÕES LTDA		ADITIVO DE VALOR:		R\$	146.934,21	% ADITADO	24,12%				
TÉRMINO PREVISTO:		03/03/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		-R\$	60.817,17	% SUPRIMIDO	-9,98%				
PRAZO DE EXECUÇÃO:		360 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 014/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	695.341,98	% TOTAL	14,14%				
DATA DE EMISSÃO:		19/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		PROCESSO:	Nº 009/2023											
PERÍODO:	04/01/2025	31/01/2025	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		VALOR DO CONTRATO:	R\$		% ACUMULADO		64,81%							
					MEDIO NO PERÍODO:		8,13%										
SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA																	
				BDI		22,35%		QUANTITATIVO				FÍSICO			FINANCEIRO		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO			
3.4.0			CORETO								R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.4.1	SINAPI 12/2022	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018		M2	R\$ 3,70	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.4.2	SINAPI 12/2022	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021		M3	R\$ 96,93	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.4.3	SINAPI 12/2022	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017		M3	R\$ 745,22	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.4.4	SINAPI 12/2022	104485	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCX = 25 MPA. AF_11/2022		M3	R\$ 3.625,12	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.4.5	SINAPI 12/2022	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017		M3	R\$ 58,77	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.4.6	SINAPI 12/2022	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		M2	R\$ 93,78	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.4.7	COMPOSIÇÃO	014	ALVENARIA DE TIUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2		M3	R\$ 143,77	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.4.8	SINAPI 12/2022	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020		M2	R\$ 215,92	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.4.9	SINAPI 12/2022	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017		M3	R\$ 716,37	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.4.10	SINAPI 12/2022	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014		M2	R\$ 49,39	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.4.11	SINAPI 12/2022	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014		M2	R\$ 62,45	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.4.12	SINAPI 12/2022	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022		M2	R\$ 5,04	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.4.13	SINAPI 12/2022	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF_06/2014		M2	R\$ 47,25	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.4.14	SINAPI 12/2022	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		M2	R\$ 68,56	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.4.15	SINAPI 12/2022	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		M2	R\$ 89,00	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.4.16	SINAPI 12/2022	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020		M2	R\$ 30,40	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.4.17	SINAPI 12/2022	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		M2	R\$ 18,16	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.5.0			URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO								R\$	84.072,76	R\$	23.963,74	R\$	60.709,02	
3.5.1	SINAPI 12/2022	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		UN	R\$ 132,07	20,00	-	-	20,00	R\$ 2.641,40	-	R\$	2.641,40	R\$	2.641,40	
3.5.2	COTAÇÃO	001	PLAY GROUND INFANTIL DE MADEIRA “Casa do Tarzan Simples”		UND	R\$ 9.176,25	1,00	-	-	1,00	R\$ 9.176,25	-	R\$	9.176,25	R\$	9.176,25	
3.5.3	SINAPI 12/2022	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		UN	R\$ 1.515,74	8,00	-	-	8,00	R\$ 12.125,92	-	R\$	12.125,92	R\$	12.125,92	
3.5.4	SINAPI 12/2022	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019		UN	R\$ 4.487,79	1,00	-	-	1,00	R\$ 4.487,79	-	R\$	4.487,79	R\$	4.487,79	
3.5.5	SINAPI 12/2022	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPACIADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32x4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P5		M	R\$ 586,76	55,01	-	-	55,01	R\$ 32.277,66	-	R\$	32.277,66	R\$	32.277,66	

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

INÍCIO DA OBRA:		07/03/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	BARROS CONSTRUÇÕES LTDA		ADITIVO DE VALOR:		R\$	146.934,21	% ADITADO	24,12%							
TÉRMINO PREVISTO:		03/03/2025	PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		-R\$	60.817,17	% SUPRIMIDO	-9,98%							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		360 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 014/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	695.341,98	% TOTAL	14,14%							
DATA DE EMISSÃO:		19/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		PROCESSO:	Nº 009/2023														
PERÍODO:	04/01/2025	31/01/2025	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		VALOR DO CONTRATO:	R\$		% ACUMULADO		64,81%										
					MEDIO NO PERÍODO:	R\$		% DESTA BMI		8,13%										
SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA					BDI		22,35%		QUANTITATIVO				FÍSICO				FINANCEIRO			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO			
3.5.6	SINAPI 12/2022	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016		M	R\$ 65,84	108,00	-	108,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 7.110,72	R\$ -	R\$ 7.110,72	R\$ -			
3.5.7	SINAPI 12/2022	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		M2	R\$ 77,87	208,72	-	208,72	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 16.253,02	R\$ -	R\$ 16.253,02	R\$ -			
4.0			PRAÇA FRANCISCA DE PAULA											R\$ 237.160,10	R\$ -	R\$ 122.838,32	R\$ 114.321,67			
4.1			DEMOLIÇÕES E RETRADAS											R\$ 14.601,56	R\$ -	R\$ 14.574,33	R\$ 27,12			
4.1.1	COMPOSIÇÃO	001	REMOÇÃO DE TUBO GALVANIZADO, BITOLAS DIVERSAS		M	R\$ 9,23	269,00	-	269,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 2.482,87	R\$ -	R\$ 2.482,87	R\$ -			
4.1.2	COMPOSIÇÃO	006	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA		M2	R\$ 4,99	252,00	-	252,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.257,48	R\$ -	R\$ 1.257,48	R\$ -			
4.1.3	SINAPI 12/2022	97635	DEMOLUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		M2	R\$ 17,77	36,80	-	36,80	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 653,93	R\$ -	R\$ 653,93	R\$ -			
4.1.4	SINAPI 12/2022	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018		M2	R\$ 3,70	500,00	-	500,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.850,00	R\$ -	R\$ 1.850,00	R\$ -			
4.1.5	COMPOSIÇÃO	009	REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO		UNIDADE	R\$ 28,74	18,00	-	18,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 517,32	R\$ -	R\$ 517,32	R\$ -			
4.1.6	COMPOSIÇÃO	011	REMOÇÃO DE MEIO-FIO DE PEDRA(GNAISSE, BASALTO, ETC.) INCLUSIVE CARGA		M2	R\$ 35,11	160,00	-	160,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 5.617,60	R\$ -	R\$ 5.617,60	R\$ -			
4.1.7	SINAPI 12/2022	97633	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		M2	R\$ 25,38	30,25	-	30,25	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 767,74	R\$ -	R\$ 767,74	R\$ -			
4.1.8	SINAPI 12/2022	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		M3	R\$ 10,43	43,91	-	43,00	0,90	97,00%	97,00%	2,00%	R\$ 457,98	R\$ -	R\$ 448,49	R\$ 9,38			
4.1.9	SINAPI 12/2022	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XKM	R\$ 3,25	306,66	-	301,20	5,46	0,00%	98,00%	1,00%	R\$ 996,64	R\$ -	R\$ 978,90	R\$ 17,74			
4.2			PRAÇA/QUADRA-FRANCISCA DE PAULA											R\$ 184.784,77	R\$ -	R\$ 108.263,99	R\$ 76.520,78			
4.2.1	SINAPI 12/2022	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021		M2	R\$ 237,82	252,00	-	202,00	50,00	0,00%	80,00%	19,00%	R\$ 59.930,64	R\$ -	R\$ 48.039,64	R\$ 11.891,00			
4.2.2	INSUMO 12/2022	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM		UN	R\$ 5.636,02	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.636,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.636,02			
4.2.3	COMPOSIÇÃO	002	REFLETOR LED 200 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	R\$ 368,56	8,00	-	-	8,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.948,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.948,48			
4.2.4	SINAPI 12/2022	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019		UN	R\$ 4.487,79	9,00	-	-	9,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 40.390,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.390,11			
4.2.5	SINAPI 12/2022	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		UN	R\$ 1.515,74	8,00	-	-	8,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 12.125,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.125,92			
4.2.6	INSUMO 12/2022	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		M3	R\$ 159,05	87,22	-	87,22	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 13.872,34	R\$ -	R\$ 13.872,34	R\$ -			
4.2.7	SINAPI 12/2022	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XKM	R\$ 3,25	523,32	-	523,32	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.700,79	R\$ -	R\$ 1.700,79	R\$ -			
4.2.8	SINAPI 12/2022	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_08/2017		M3	R\$ 716,37	1,73	-	1,73	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.239,32	R\$ -	R\$ 1.239,32	R\$ -			
4.2.9	SINAPI 12/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022		M3	R\$ 878,11	8,65	-	8,65	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 7.595,65	R\$ -	R\$ 7.595,65	R\$ -			
4.2.10	SINAPI 12/2022	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016		M	R\$ 68,17	48,60	-	48,60	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 3.313,06	R\$ -	R\$ 3.313,06	R\$ -			
4.2.11	COMPOSIÇÃO	010	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA		M2	R\$ 14,86	237,50	-	-	237,50	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.529,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.529,25			
4.2.12	SINAPI 12/2022	104485	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_11/2022		M3	R\$ 3.625,12	4,13	-	4,13	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 14.971,74	R\$ -	R\$ 14.971,74	R\$ -			

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Vicente Maria Roberto
Eng. Civil
ENR-033247-5
CREA-PE

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

INÍCIO DA OBRA:		07/03/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		BARROS CONSTRUÇÕES LTDA		ADITIVO DE VALOR:		R\$	146.934,21	% ADITADO	24,12%		
TÉRMINO PREVISTO:		03/03/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		-R\$	60.817,17	% SUPRIMIDO	-9,98%		
PRAZO DE EXECUÇÃO:		360 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 014/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	695.341,98	% TOTAL	14,14%		
DATA DE EMISSÃO:		19/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		PROCESSO:		Nº 009/2023									
PERÍODO:	04/01/2025	31/01/2025	VALOR DO CONTRATO:		R\$		609.224,94		% ACUMULADO							
			ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		R\$		49.545,60		% DESTES BM							
SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA			EMPREENDIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		BDI	22,35%	QUANTITATIVO				FÍSICO				FINANCEIRO	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNID.	PRECÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
4.2.13	SINAPI 12/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016		M	R\$ 73,07	160,00	-	160,00	-	0,00%	100,00%	R\$ 11.691,20	R\$ -	R\$ 11.691,20	R\$ -
4.2.14	SINAPI 12/2022	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022		M2	R\$ 77,87	75,00	-	75,00	-	0,00%	100,00%	R\$ 5.840,25	R\$ -	R\$ 5.840,25	R\$ -
4.3			PINTURA										R\$ 9.108,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.108,40
4.3.1	SINAPI 12/2022	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020		M2	R\$ 30,40	37,80	-	-	37,80	0,00%	0,00%	R\$ 1.149,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.149,12
4.3.2	SINAPI 12/2022	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020		M2	R\$ 26,92	37,80	-	-	37,80	0,00%	0,00%	R\$ 1.017,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.017,57
4.3.3	SINAPI 12/2022	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		M2	R\$ 18,16	104,70	-	-	104,70	0,00%	0,00%	R\$ 1.901,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.901,35
4.3.4	SINAPI 12/2022	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÃO). AF_05/2021		M	R\$ 1,84	160,00	-	-	160,00	0,00%	0,00%	R\$ 294,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 294,40
4.3.5	SINAPI 12/2022	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021		M2	R\$ 22,63	209,72	-	-	209,72	0,00%	0,00%	R\$ 4.745,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.745,96
4.4			APARELHOS GINÁSTICA/BRINQUEDOS										R\$ 26.694,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.694,32
4.4.1	SINAPI 12/2022	103191	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021		UN	R\$ 2.694,79	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	R\$ 2.694,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.694,79
4.4.2	SINAPI 12/2022	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021		UN	R\$ 6.966,47	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	R\$ 6.966,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.966,47
4.4.3	SINAPI 12/2022	103209	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021		UN	R\$ 3.203,00	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	R\$ 3.203,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.203,00
4.4.4	SINAPI 12/2022	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021		UN	R\$ 4.643,81	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	R\$ 4.643,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.643,81
4.4.5	COTAÇÃO	001	PLAY GROUND INFANTIL DE MADEIRA "Casa do Tarzan Simples"		UND	R\$ 9.176,25	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	R\$ 9.176,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.176,25
4.5			PAISAGISMO										R\$ 1.981,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.981,05
4.5.1	SINAPI 12/2022	98510	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		UN	R\$ 132,07	15,00	-	-	15,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.981,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.981,05
5.0			SERVIÇOS FINAIS										R\$ 3.616,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.616,48
5.1	COMPOSIÇÃO	004	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE BROZE *35 X 50*CM		UN	R\$ 1.808,24	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	R\$ 3.616,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.616,48
TOTAL DA MEDIÇÃO			quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos			TOTAL GERAL				TOTAL GERAL				TOTAL GERAL		
